

Отчет об исполнении инвестиционной программы по АО "Тамбовская сетевая компания", млн. рублей без НДС (1 квартал 2024 года)



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонения				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утверждений ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	-	181,430	2,304	0,000	2,304	0,000	0,000	0,000	0,000	181,430	0,000	2,304	2,304	2,304	2,304	174,637	-174,637	-96,26%	0,000	0,000	0,000
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Создание систем телемеханики и связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Новое строительство	-	181,430	2,304	0,000	2,304	0,000	0,000	0,000	0,000	181,430	0,000	2,304	2,304	2,304	2,304	174,637	-174,637	-96,26%	0,000	0,000	0
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	110,541	2,304	0,000	2,304	0,000	0,000	0,000	0,000	110,541	0,000	2,304	2,304	2,304	2,304	108,237	-108,237	-97,92%	0,000	0,000	0,000
2.1.1	Строительство объектов электросетевого хозяйства в г. Кирсанов Тамбовской области	-	11,996	0,378	0,000	0,378	0,000	0,000	0,000	0,000	11,996	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	11,618	- 11,618	-96,85%	-	-	-
2.1.2	Строительство объектов электросетевого хозяйства в г. Рассказово Тамбовской области	-	28,091	0,569	0,000	0,569	0,000	0,000	0,000	0,000	28,091	0,569	0,569	0,569	0,569	0,569	27,522	- 27,522	-97,97%	-	-	-
2.1.3	Строительство объектов электросетевого хозяйства в г. Котовак Тамбовской области	-	34,358	-	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	34,358	-	-	-	-	-	34,358	- 34,358	-100,00%	-	-	-
2.1.4	Строительство объектов электросетевого хозяйства в г. Уварово Тамбовской области	-	19,990	0,557	0,000	0,557	0,000	0,000	0,000	0,000	19,990	0,557	0,557	0,557	0,557	0,557	19,434	- 19,434	-97,22%	-	-	-
2.1.5	Строительство объектов электросетевого хозяйства в г. Минуринск, Минуринский район Тамбовской области	-	16,105	0,801	0,000	0,801	0,000	0,000	0,000	0,000	16,105	0,801	0,801	0,801	0,801	0,801	15,305	- 15,305	-95,03%	-	-	-
2.2	Прочее новое строительство	-	70,889	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,889	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	66,401	-66,401	-8,000	0,000	0,000	0,000
2.2.1	Автовышка ИСС-131.187 на шасси ГАЗ NEXT (или аналог)	-	12,083	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,083	-	-	-	-	-	12,083	- 12,083	-100,00%	-	-	-
2.2.2	БКМ -TAURUS 055A на базе ГАЗ 33086 (или аналог)	-	20,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,360	-	-	-	-	-	20,360	- 20,360	-100,00%	-	-	-
2.2.3	БКМ-317A C41A23-20 GAZon NEXT Садко (или аналог)	-	10,213	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,213	-	-	-	-	-	10,213	- 10,213	-100,00%	-	-	-
2.2.4	Крано-манипуляторная установка Don Yang 192611 (или аналог)	-	3,513	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,513	-	-	-	-	-	3,513	- 3,513	-100,00%	-	-	-
2.2.5	Павильон обустройство на БКМ гидротранспортер BR-8 удлинитель песка, индекс диаметром 350 мм, адаптер для экскаватора New Holland (или аналог)	-	0,321	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,321	-	-	-	-	-	0,321	- 0,321	-100,00%	-	-	-
2.2.6	Домовоз (или аналог)	-	18,792	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,792	-	-	-	-	-	18,792	- 18,792	-100,00%	-	-	-

2.2.7	Прицеп-домовоз самосвальная (или аналог)		3,325							3,325													
2.2.8	Мебель	-	0,558	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,558							0,558	-	0,558	-100,00%			
2.2.9	Оргтехника	-	0,562	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,562							0,562	-	0,562	-100,00%			
2.2.10	Дизельный генератор Renault RW5010 (или аналог)		0,678							0,678													
2.2.11	Метрологическое оборудование		0,485							0,485													
	<i>Справочно:</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- * В ценах отчетного года
- ** План согласно утвержденной инвестиционной программе
- *** Итоговые итоги за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Отчет о вкладах/выпадах объектов по АО "Тамбовская сетевая компания" (I квартал 2024 года)

Утверждено

директор АО "ТСК"


М.В. Маховин



_____ год

Table with 22 columns and 16 rows. Columns include: № вкл, Наименование объекта, and 21 columns for 'Вклад' and 'Выпад' (I кв., II кв., III кв., IV кв., 2024 г.) for 'МВА/км'. Rows 1-16 list various construction and equipment items like 'Строительство объектов электросетевого хозяйства', 'Автовышка ПСС-131 187', 'БKM-TAURUS 035A', 'БKM-317A C41A23-20 GA/om NEXT', 'Крано-манипуляторная установка Den Zugr 192611', 'Панельное оборудование на БKM гидротранспортер BR-8', 'Принтер-компьютер совместный', 'Месель', 'Средства измерений', 'Двухфазный генератор Rensol RW50HD', and 'Металлоизмерительное оборудование'.

**Отчет о техническом состоянии объекта по АО "Тамбовская сетевая компания"
(1 квартал 2024 года)**

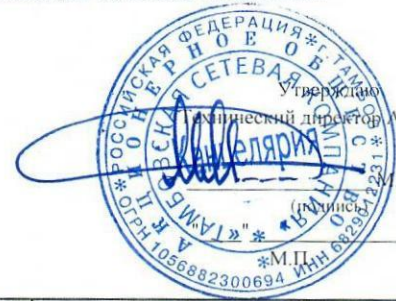

АО "ТСК"
И.В. Махонин
года

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Строительство объектов электросетевого хозяйства г. Кирсанов Тамбовской области	-	-	-	2024	2024	+	x	+	x
2	Строительство объектов электросетевого хозяйства г. Рассказово Тамбовской области	0,65	-	-	2024	2024	+	x	+	x
3	Строительство объектов электросетевого хозяйства г. Котовск Тамбовской области	-	-	-	2024	2024	+	x	+	x
4	Строительство объектов электросетевого хозяйства в г. Уварово Тамбовской области	0,32	-	-	2024	2024	+	x	+	x
5	Строительство объектов электросетевого хозяйства в г. Мичуринск, Мичуринский район Тамбовской области	0,32	-	-	2024	2024	+	x	+	x
6	Автовышка ПСС-131.187 на шасси ГАЗ NEXT (или аналог)	-	-	-	2024	2024	x	x	x	x
7	БКМ -TAURUS 035A на базе ГАЗ 33086 (или аналог)	-	-	-	2024	2024	x	x	x	x
8	БКМ-317A C41A23-20 GAZon NEXT Садко (или аналог)	-	-	-	2024	2024	x	x	x	x
9	Крано-манипуляторная установка Don Yang 192611 (или аналог)	-	-	-	2024	2024	x	x	x	x
10	Навесное оборудование на БКМ: гидравлический BR-8, удлинитель шнека, шнек диаметром 350 мм, адаптер для экскаватора New Holland (или аналоги)	-	-	-	2024	2024	x	x	x	x
11	Ломовоз (или аналог)	-	-	-	2024	2024	x	x	x	x
12	Прицеп-ломовоз самосвальный (или аналог)	-	-	-	2024	2024	x	x	x	x
13	Мебель	-	-	-	2024	2024	x	x	x	x
14	Оргтехника	-	-	-	2024	2024	x	x	x	x
15	Дизельный генератор Rensol RW50H0 (или аналог)	-	-	-	2024	2024	x	x	x	x
16	Метрологическое оборудование	-	-	-	2024	2024	x	x	x	x
	Всего:	1,29	-	-	2024	2024				
